



BALANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL TRAMO 5B


FECHA DE CORTE: MARTES 29 DE MARZO DE 2022 (PROGRAMACIÓN INICIAL A PARTIR DEL 28-01-2022)

# SEMANA	INICIO	FIN	EJECUTADO	PROGRAMADO	COSTO DIFERENCIA	PORCENTAJE FINANCIERO		
			COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO		EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
1	28/1/2022	8/2/2022	\$13,416,004.00	\$26,136,909.00	-\$12,720,905.00	0.16%	0.31%	-0.15%
2	9/2/2022	15/2/2022	\$32,875,261.00	\$59,246,700.00	-\$26,371,439.00	0.39%	0.70%	-0.31%
3	16/2/2022	22/2/2022	\$93,587,897.00	\$96,665,060.00	-\$3,077,163.00	1.11%	1.15%	-0.04%
4	23/2/2022	1/3/2022	\$128,017,179.00	\$149,379,153.00	-\$21,361,974.00	1.52%	1.78%	-0.25%
5	2/3/2022	8/3/2022	\$169,571,014.00	\$175,469,588.00	-\$5,898,574.00	2.02%	2.09%	-0.07%
6	9/3/2022	15/3/2022	\$208,551,352.00	\$290,098,709.00	-\$81,547,357.00	2.48%	3.45%	-0.97%
7	16/3/2022	22/3/2022	\$235,723,416.00	\$431,363,563.00	-\$195,640,147.00	2.80%	5.13%	-2.32%
8	23/3/2022	29/3/2022	\$276,489,112.00	\$576,982,442.00	-\$300,493,330.00	3.29%	6.86%	-3.57%
9	30/3/2022	5/4/2022		\$737,736,623.00			8.77%	
10	6/4/2022	12/4/2022		\$890,932,397.00			10.59%	
11	13/4/2022	19/4/2022		\$1,068,491,007.00			12.70%	
12	20/4/2022	26/4/2022		\$1,233,239,009.00			14.65%	

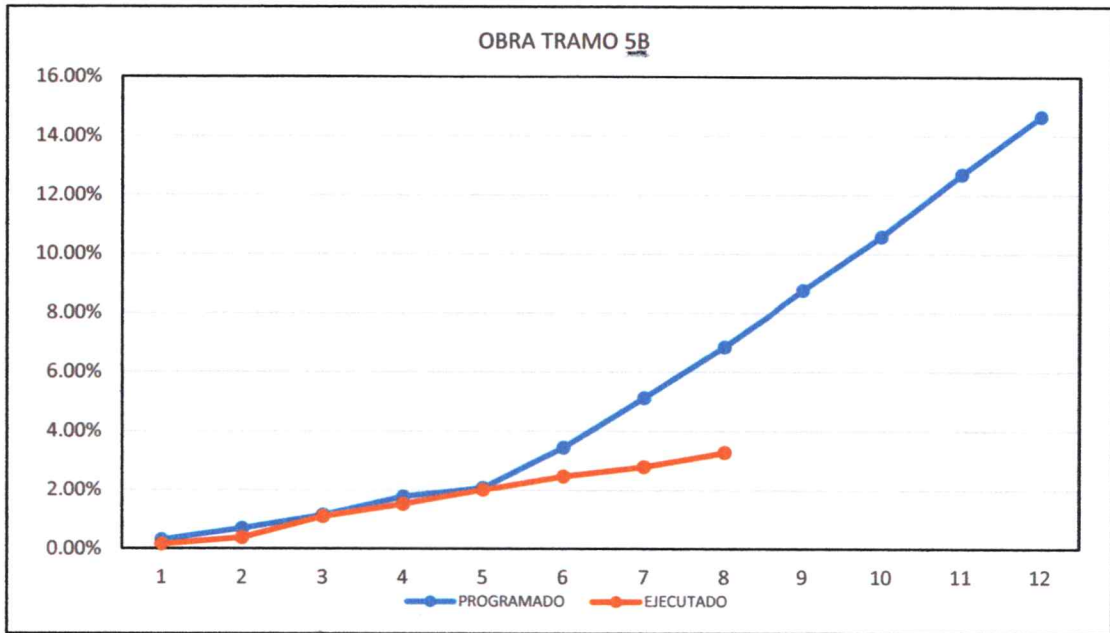

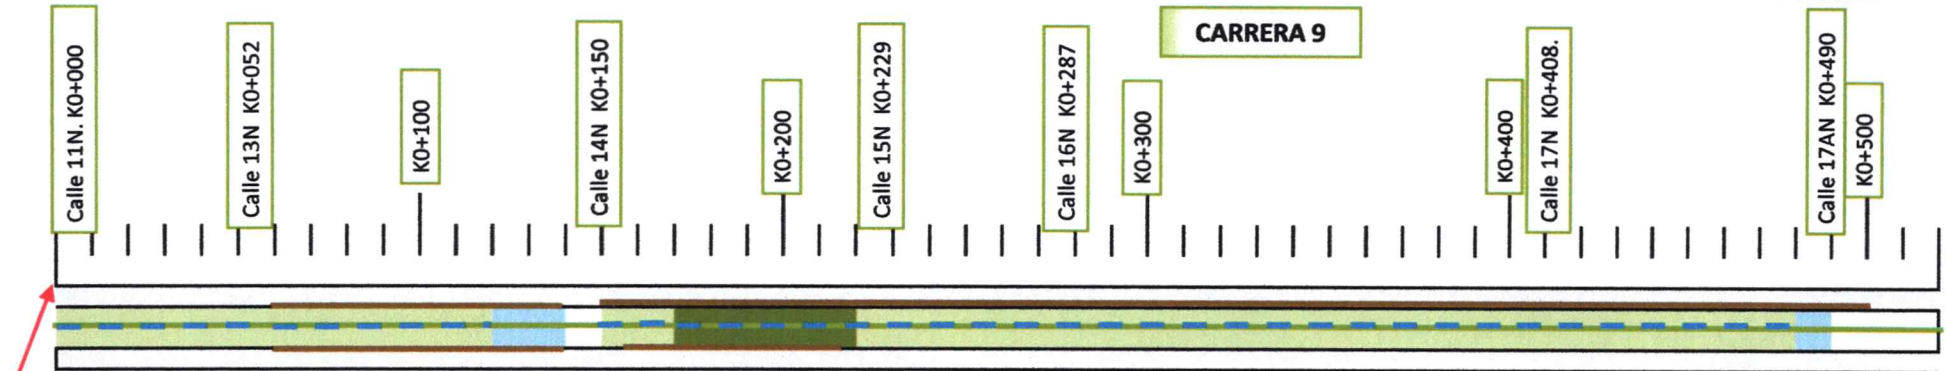

AVANCE OBRA FISICA PAVIMENTACION	8.85%
AVANCE OBRA FISICA CICLORUTA	0.00%
AVANCE OBRA FISICA ESPACIO PUBLICO	0.00%

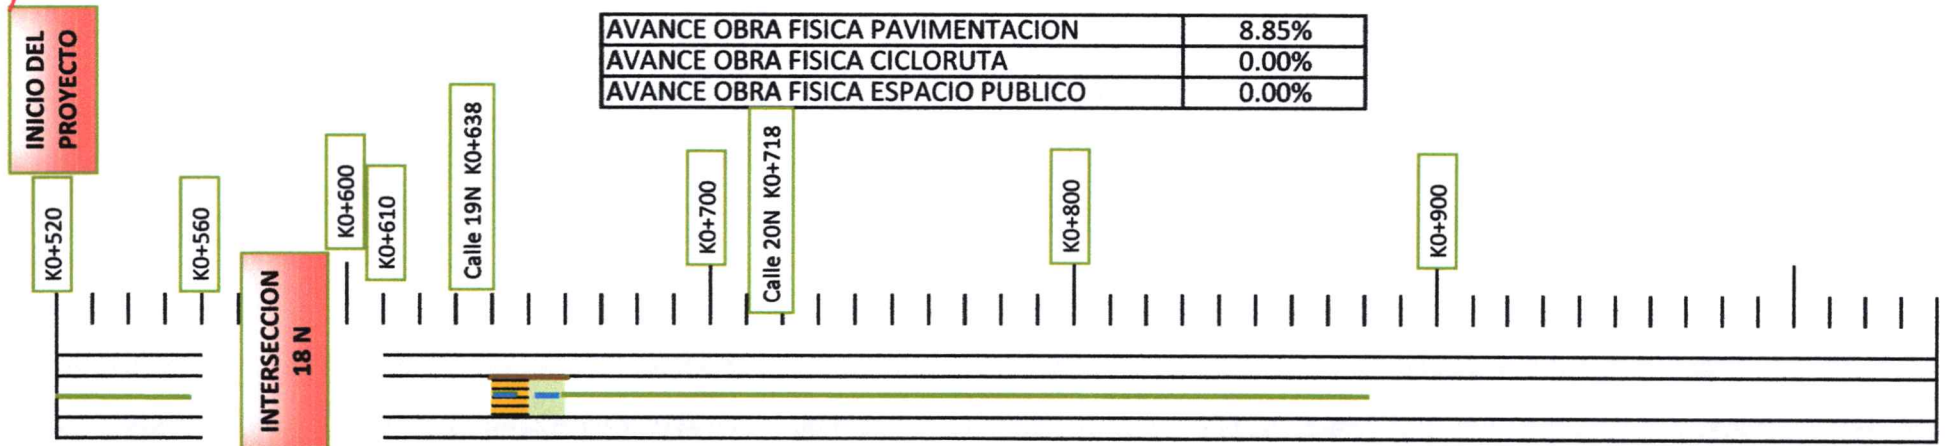

RESUMEN:

TOTAL ACUMULADO AVANCE OBRA	PROG.:	6.86%
INVERSION	EJEC.:	3.29%

TOTAL ACUM. PAVIMENTACION OBRA FISICA	7.96%
TOTAL ACUM. CICLORUTA OBRA FISICA	0.00%
TOTAL ACUM. ESPACIO PUBLICO OBRA FISICA	0.00%

CONVENCIONES:

Localización y Replanteo	Demol de pisos, andenes y sardineles	Excavacion a Mano	Relleno para Andenes	Espacio publico Andenes	Bordillos en Terminados
Demolicion Pavimento y Estructuras	Excavacion varias a Maquina	Mejoram Material Granular	Conformacion y compact Subrasante	Subbase Granular	Base Granular
Carpeta Asfáltica	Nivelación Formaleta Metálica Pav Rigido		Señalización	Ejecutado	En ejecución

MEDIDAS DEL PROYECTO:

Distancia tramo 5B Fase 1 =	1485.00 m
Distancia tramo 5B Fase 2 =	115.04 m
Distancia tramo 5B Fase 3 =	50.00 m

Total tramo via=	1,650.00 m
Total tramo Cicloruta=	1,650.00 m
Total tramo espac Público=	6,608.00 m2

Obra Ejecutada:

1. Localización y Replanteo:	=	760.00 ml
2. Demolición de pisos, andenes y bordillos:	=	15.00 ml
3. Demolición de pisos, andenes y bordillos:	=	555.00 ml
4. Demolición pavimento y estructuras:	=	540.00 ml
5. Excavaciones varias a Maquina:	=	530.00 ml
6. Conform y compact de la subrasante:	=	530.00 ml
7. Subbase granular	=	520.00 ml
8. Base granular	=	ml
9. Imprimación	=	ml

10. Carpeta Asfáltica:	=	ml
11. Excavación a mano And.:	=	ml
12. Relleno para base Anden:	=	ml
13. Espacio Público Andenes:	=	ml
14. Bordillos y accesos:	=	ml
15. Señalización:	=	ml
16. Sumideros	=	Und

Rendimientos en porcentajes:

1. Localización y Replanteo:	=	46.06 %
2. Demolición de pisos, andenes y bordillos:	=	0.91 %
3. Demolición de pisos, andenes y bordillos:	=	33.64 %
4. Demolición pavimento y estructuras:	=	32.73 %
5. Excavaciones varias a Maquina:	=	32.12 %
6. Conform y compact de la subrasante:	=	32.12 %
7. Subbase granular	=	31.52 %
8. Base granular	=	0.00 %
9. Imprimación	=	0.00 %

10. Carpeta Asfáltica:	=	0.00 %
11. Excavación a mano And.:	=	0.00 %
12. Relleno para base Anden:	=	0.00 %
13. Espacio Público Andenes:	=	0.00 %
14. Bordillos y accesos:	=	0.00 %
15. Señalización:	=	0.00 %
16. Sumideros	=	0.00 %
