

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Código: P-01-GI-1
PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	Versión:02
	Fecha: 07/02/2022

## 1. OBJETO

Elaborar y mantener actualizado con apoyo de los líderes de procesos de la Entidad el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el cual define con las respectivas fechas y tiempos de duración las diferentes actividades del componente de infraestructura del SETP.

## 2. ALCANCE

El Plan de Ejecución Plurianual (PEP) del proceso de Infraestructura, relaciona de manera general los tiempos estimados en la ejecución de cada una de las actividades que tiene el componente del Proceso de Infraestructura. El PEP, utilizado como herramienta de control y seguimiento, es requisito de entrega ante el Ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo.

## 3. RESPONSABLE

Gerente – líder proceso de infraestructura y contratista de apoyo gestión de infraestructura.


## 4. DEFINICIONES

### 4.1 PEP

Plan de Ejecución Plurianual: Es el documento que incorpora los proyectos de inversión que son considerados prioritarios para alcanzar las metas establecidas.

## 5. NORMATIVIDAD

- CONPES 3602 de 2009
- CONPES 3833 de 2015



GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Código: P-01-GI-1
PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	Versión:02
	Fecha: 07/02/2022

## 6. CONDICIONES GENERALES

El profesional encargado del Plan de Ejecución Plurianual, deberá conocer los diferentes procesos de la Entidad y tener conocimiento sobre las generalidades del proyecto para ejecutar de manera eficaz los ajustes al PEP. El profesional será el único encargado de ajustar y hacer seguimiento a las actividades.

El Plan se debe proyectar en un software que permita su fácil manejo y la posibilidad de hacer seguimiento continuo con porcentaje de avance.

### 6.1 RIESGOS Y CONTROLES

#### 6.1.2 Riesgos

- Incluir actividades que no corresponden a las mencionadas en el CONPES.
- Definir fechas en el Plan que no se puedan cumplir

#### 6.1.2 Puntos de Control


- Dar cumplimiento al plan de ejecución plurianual




## 7. CONTENIDO

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Elaboración en borrador del Plan de Ejecución Plurianual del componente de Infraestructura	Preparación de documento con base en el componente de Infraestructura mencionado por el CONPES 3602	Profesional de apoyo al proceso de planeación	Informe en borrador de las actividades del componente de infraestructura
2	Ajuste al PEP	Revisión con los profesionales del Proceso de Infraestructura las actividades del Plan para sus respectivos ajustes	Profesional de apoyo al proceso de planeación y profesionales de apoyo al Proceso de Infraestructura	Lista de asistencia a la revisión F-01-GA-11 y F-12-GAD-11 acta de ajustes y recomendaciones
3	Elaboración final de las actividades del PEP	Con base en las recomendaciones de los profesionales del Proceso se ajusta el Plan para su construcción final, el cual será susceptible a modificaciones.	Profesional de apoyo al proceso de planeación	Archivo final de las actividades del PEP
4	Definición fechas y estimación de tiempos en las actividades del componente	Con apoyo de los líderes de los procesos de la Entidad, se define las fechas de inicio y duración de cada	Profesional de apoyo al proceso de planeación y líderes de los	Listado de asistencia F-01-GA-11, F-12-GAD-11 Acta de reunión y

		actividad comprendida en los componentes de infraestructura	procesos de la Entidad	documento final del PEP
5	Socialización PEP	Después de tener el documento final del cronograma – PEP, se realiza la socialización del cronograma a todos los funcionarios de la Entidad	Profesional de apoyo al proceso de planeación	F-01-GA-11 Listado de asistencia y registro fotográfico
6	Seguimiento al PEP	Se llevará el seguimiento con la frecuencia que así se solicite, para llevar control sobre las fechas estimadas de cada actividad.	Profesional de apoyo al proceso de planeación	Archivo de cronograma – PEP  Soporte de evidencias de las actividades del componente de infraestructura para el cumplimiento de las metas



## 8. DIAGRAMA DE FLUJO

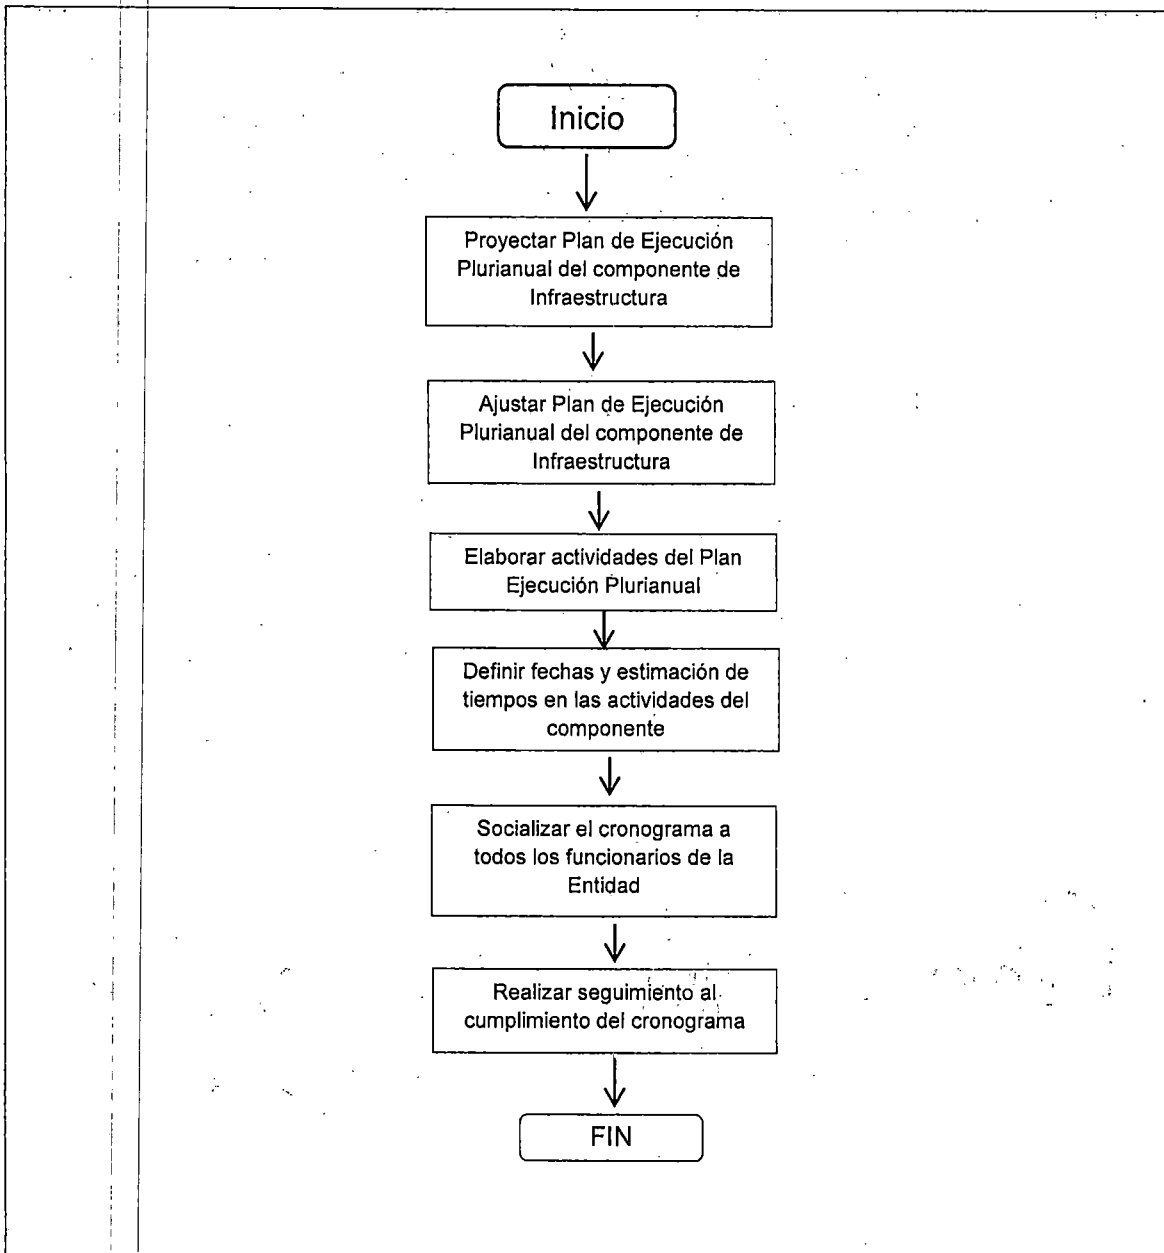

<b>GESTIÓN INFRAESTRUCTURA</b>	Código: P-01-GI-1
<b>PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA</b>	Versión:02
	Fecha: 07/02/2022

## 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos que se deben consultar para la elaboración de procedimiento son los siguientes:




- Plan de Adquisiciones (PA)
- Plan Operativo Anual (POA)
- CONPES 3602 de 2009
- CONPES 3833 de 2015

## 10. ANEXOS

- F-01-GA-11 Lista de asistencia a la revisión
- F-12-GAD-11 acta de ajustes

## 11. NOTAS DE CAMBIO

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO CAMBIO
1	28/03/2018	Plantilla vieja
2	07/02/2022	Revisión y actualización del procedimiento y cambio de plantilla según ajuste de imagen corporativa.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:  Gustavo Rojas	Firma:  William Andrés Ramos	Firma:  Robert D. Hormiga
Contratista Líder Gestión Infraestructura	Contratista Líder Proceso Planeación	Cargo: Gerente

Revisó: Pablo Bermúdez – Contratistas Apoyo Planeación
